SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Cronograma do Projeto

Gráfico de Gantt e marcos

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Cronograma do Projeto
Código	VIAB-GP-05
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR


HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori. As barras do gráfico usam as datas dos registros do projeto (git, atas e documentos); onde só se conhece o mês, a barra cobre o período inteiro.

1. GRÁFICO DE GANTT

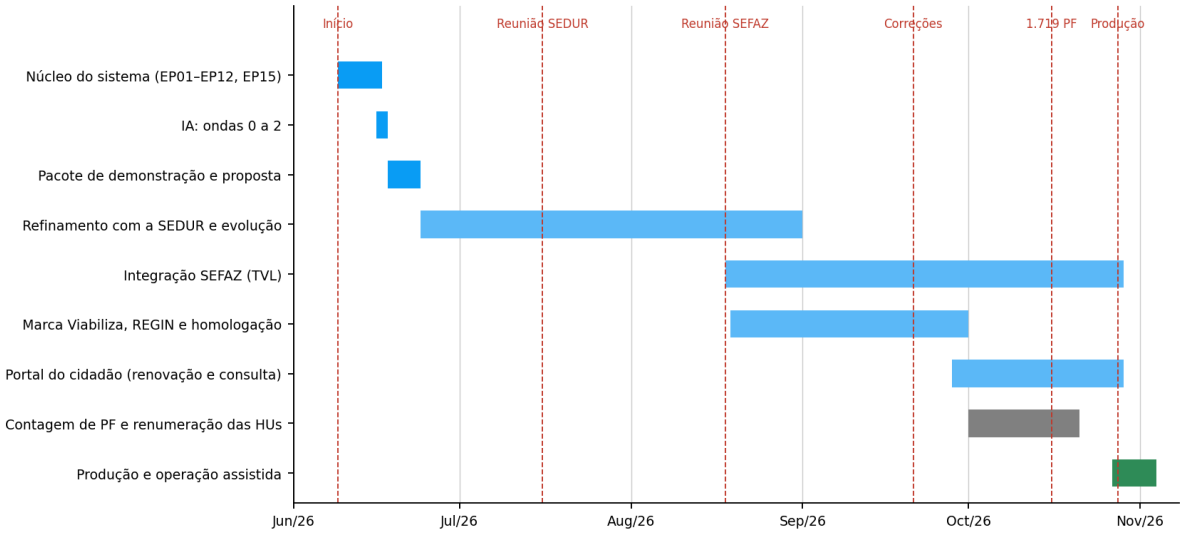

Azul-escuro: execução do núcleo; azul-claro: evolução contínua; cinza: dimensionamento; verde: produção. Linhas tracejadas são marcos.

2. MARCOS

Data	Marco	Fonte do registro
09/06/2026	Início e reunião de requisitos com a SEDUR	Primeiro commit; `docs/ANALISE-HUs-REUNIAO-SEDUR.md`
10/06/2026	Fases 1 e 2 concluídas	Roadmap
13/06/2026	Fases 3, 3.1 e 4 concluídas	Roadmap
14 e 15/06/2026	Motores LOUOS e risco, consulta prévia, solicitação, expresso, análise, comunicação e auditoria	Roadmap
16 e 17/06/2026	Relatórios e indicadores; IA ondas 0 a 2	Roadmap
18/06/2026	Imagem Docker e stack do Portainer	Git
23/06/2026	Relatório de status e proposta comercial	`docs/status-report-sile-2026-06-23`
16/07/2026	Reunião com a SEDUR (escritório virtual, relatórios, envio para análise)	`docs/reunioes/2026-07-16-cliente`
18/08/2026	Reunião com a SEFAZ sobre a consulta de TVL	`docs/reunioes/2026-08-18-sefaz-tvl`
19/08/2026	Sistema renomeado para Viabiliza	Git
17/09/2026	API de recebimento do REGIN publicada	Git
21/09/2026	Ciclo de correções de homologação	`docs/homologacao/corretivas-2026-09-21`
25/09/2026	Ofício de registro do endpoint do REGIN	`docs/oficios`
28/09/2026	Renovação de viabilidade no portal	Git
01/10/2026	Contagem de PF 3.3: 1.618 PF	`docs/contagem-pf`
16/10/2026	Recontagem: 1.719 PF	Memória de cálculo
19 e 20/10/2026	Renumeração das HUs	`mapa-renumeracao-hus`
27 e 28/10/2026	Portal de Serviços e Viabiliza em produção	Registro de publicação
28/10/2026	Consulta de TVL pela SEFAZ publicada	Git

3. EXECUÇÃO POR FASE DO ROADMAP (NÚCLEO)

Fase	Conclusão	Planos
1. Identidade, acesso e auditoria	10/06/2026	9/9
2. Administração base	10/06/2026	concluída
3. Cadastro empresarial	13/06/2026	9/9
3.1. Fundação assíncrona	13/06/2026	5/5
4. Georreferenciamento e território	13/06/2026	8/8
5. Motor de regras da LOUOS	14/06/2026	9/9
6. Classificação de risco	14/06/2026	9/9
7. Consulta prévia	14/06/2026	10/10
8. Solicitação de viabilidade	14/06/2026	16/16
9. Fluxo expresso	14/06/2026	12/12
10. Análise técnica	15/06/2026	18/18
11. Pendências e comunicação	15/06/2026	10/10
12. Auditoria e compliance	15/06/2026	12/12
15. Relatórios e indicadores	16/06/2026	15/15
14. Inteligência artificial (ondas 0 a 2)	17/06/2026	entregues

4. PRÓXIMO CICLO

O backlog está a definir com a SEDUR. As datas do próximo ciclo serão fixadas depois da reunião de priorização e dependem de decisões e acessos da SEDUR e de terceiros.
